REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

22 SEP 2026

Cliente / planta:	Aluminum	**Fecha:**	22 de septiembre de 2026
Participantes:	Mario Alberto Mtz Torres, Marco Antonio Méndez, Efraín Córdova, Francisco, Sergio Trejo y operador de barredora.	**Ubicación:**	Taller, obra La Nueva España y Aluminum

Resumen de la jornada

La jornada inició con la coordinación del traslado del operador de la barredora y el arranque de limpieza de vialidades en Aluminum. Durante la mañana también se revisó la configuración de las puertas corredizas de la Euromalla y se atendió la definición de alturas para la estructura de La Nueva España. En la visita a obra se tomaron niveles en columnas de concreto y se estableció una altura de 4.615 m para las columnas HSS, incluyendo placa base de 1 pulgada. En taller se cortaron las 4 columnas chicas para la obra La Nueva España y se unieron 2 tramos de HSS de 16x16x5/16" para conformar 1 de las 4 columnas de 4.615 m. Por la tarde se continuó la cotización de la extensión de 80 ml del pasillo de vía, se revisaron elementos de sujeción y material sobrante de malla, y se solicitó la fabricación de orejas de ángulo para candado. La limpieza de vialidades quedó documentada fotográficamente al cierre de la jornada.

Resumen de horarios

Hora	Actividad
07:51	Mario sale del taller rumbo a La Pila para recoger al operador de la barredora.
08:23	Mario reporta estar en La Pila; el operador aún no llegaba.
08:25	Llamada de Enoc: se solicita iniciar barrido frente al horno rotatorio.
08:39	Se reporta retraso del operador por tráfico en la autopista.
08:40	Se solicita a Francisco acondicionar el carrito de oxicorte con ruedas; se detectan cilindros/tanques sueltos.
08:50	Revisión de alturas de la estructura de La Nueva España con Sergio Trejo.
09:20	Solicitud de estimación para instalación de losacero, aprox. 16,300 m²; referencias de $150/m² en zonas bajas y $180/m² en zonas superiores.
09:36	En taller se define la configuración de malla para las puertas corredizas.
09:41	Llegada de Mario y operador de barredora a Aluminum.
10:19	Inicio de actividades de limpieza en vialidades.
10:38	Se informa que no queda combustible disponible para jornadas posteriores de la barredora.
11:22	Salida a La Nueva España para revisión de alturas de columnas.
12:16	Llegada a obra La Nueva España.
12:25	Levantamiento de niveles y definición de longitud de HSS; altura final de 4.61 m incluyendo placa base de 1 pulgada.
12:55	Salida de obra; se plantea realizar corte de las columnas para iniciar trabajos.
13:20	Llegada al taller.
13:30	Trabajo en cotización para extensión de 80 ml de pasillo de vía.
14:00	Revisión del diseño de sujeción de puertas corredizas: postes, ruedas guía, taquetes y pijas.
14:30	Revisión de material sobrante de instalación de malla con Efraín Córdova.
16:00	Se solicita a Marco Antonio Méndez fabricar orejas de ángulo para candado en las puertas corredizas.

Plan de trabajo

Fecha / frente	Plan / condición
Barredora	Asegurar combustible y continuidad del programa de limpieza de vialidades principales.
Euromalla - puertas	Continuar fabricación de accesorios, revisión de postes/ruedas guía y preparación de instalación.
La Nueva España	Continuar fabricación de las 3 columnas restantes. Ya se cortaron las 4 columnas chicas y se conformó 1 columna de 4.615 m mediante la unión de 2 tramos de HSS 16x16x5/16".
Pasillo de vía	Continuar desarrollo de la cotización para extensión de 80 ml.


Seguimiento de frentes - jornada 22 de septiembre

Frente	Avance	Estado
Barredora	Limpieza de vialidades en Aluminum	En proceso / continuidad
Euromalla	Puertas corredizas, accesorios y material sobrante	En fabricación
La Nueva España	Se cortaron las 4 columnas chicas y se unieron 2 tramos de HSS 16x16x5/16" para obtener 1 de las 4 columnas de 4.615 m.	Fabricación en proceso - 1 de 4 columnas conformada
Pasillo de vía	Cotización extensión 80 ml	En cotización

Evidencia fotográfica




Evidencia 1. Fabricación de bastidor con malla para puerta corrediza en taller.



Evidencia 2. Armado y ajuste de panel de malla para puerta corrediza.



Evidencia 3. Revisión en obra La Nueva España para toma de niveles y alturas de columnas.




Evidencia 4. Croquis de campo y registro de dimensiones para columnas.



Evidencia 5. Puertas de malla terminadas con acabado de pintura.




Evidencia 6. Elementos HSS preparados para ajuste y corte.

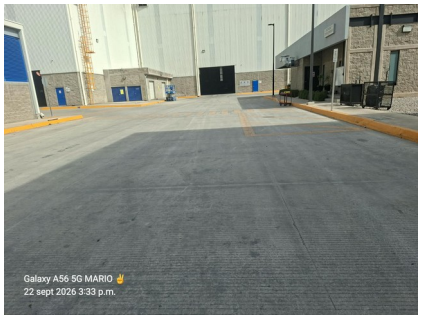

Evidencia 7. Vialidad de Aluminum posterior a limpieza con barredora. Registro 15:33 h.



Evidencia 8. Limpieza de vialidades en zona operativa de Aluminum. Registro 16:18 h.

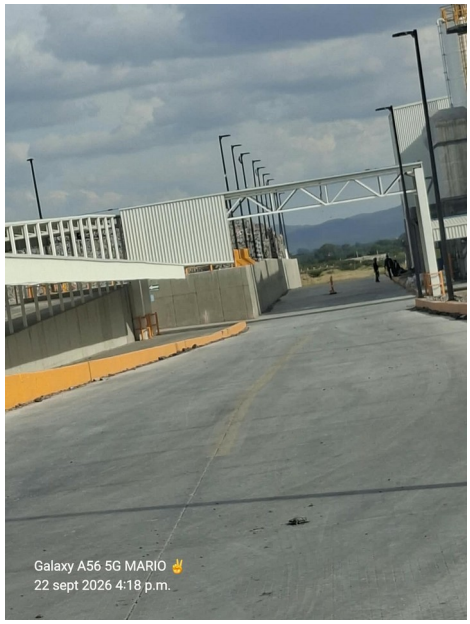

Evidencia 9. Condición de vialidad al cierre de la jornada de limpieza. Registro 16:18 h.

Nota: La evidencia fotográfica documenta los frentes atendidos en taller, obra La Nueva España y Aluminum durante la jornada del 22 de septiembre.
